

Objet : Comité de suivi n°2 de la convention de coopération ONEMA – IGN relative à la coproduction de la BD Topage®

Prochaine réunion : novembre (avant le COPIL Onema – IGN)

Liste de diffusion

Participants	Service/Unité	Personnes à informer	Service/Unité
L. Breton B. Freidman F. Bécirspahic T. Royer	AFB/DAPP/DSOD/SDGI IGN/DPC/SAPP/CLN IGN/DPC/SP/CKP IGN/SBV/PBM	L. Coudercy Elise-Rachel Mathis	AFB/DAPP/DSOD/SDGI IGN/SBV/PBM

Date	Visa	Nom	Service	Validé par
07/07/2017		T. Royer	SBV/PBM	

Tableau récapitulatif des actions

N°	Origine	Libellé	Acteur	Date de fin	Reprévision
1	COSUI 1	Récupérer le réseau principal de l'agence de l'eau Adour-Garonne et Seine-Normandie	AFB	1/07/2017	1/11/2017
2	COSUI 1	Présenter des scénarios d'utilisation de l'Espace collaboratif	IGN	1/07/2017	
3	COSUI 1	Sensibiliser et former les acteurs de l'eau à l'utilisation de l'Espace collaboratif	AFB/IGN	1/07/2017	
4	COSUI 1	Définir les attributs à filtrer lors de la diffusion des données	AFB	1/07/2017	1/11/2017
5	COSUI 1	Documenter les données diffusées	IGN	1/07/2017	1/11/2017
6	COSUI 1	Définir les règles de mises à jour des données BD Topage®	IGN	1/07/2017	1/11/2017
7	COSUI 1	Définir le périmètre de la réunion nationale de lancement de la BD Topage®	AFB	1/07/2017	1/11/2017
8	COSUI 1	Mettre en place le site d'information sur la BD Topage®	AFB	1/07/2017	1/11/2017
9	COSUI 2	Configurer l'Espace collaboratif pour la mise en place des échanges.	IGN	31/08/2017	
10	COSUI 2	S'assurer de la prise en compte des alertes : mettre en œuvre une animation de réseau	AFB	1/11/2017	
11	COSUI 2	Contacteur les plateformes régionales pour organiser le Topage Tour (si possible avant la fin 2017)	IGN/AFB	15/08/2017	
12	COSUI 2	Définir un pré-programme pour 2018	IGN	31/08/2017	
13	COSUI 2	Choisir les inventaires à intégrer	AFB	15/08/2017	
14	COSUI 2	Faire des tests d'intégration de ces inventaires et chiffrer ces intégrations	IGN	15/08/2017	
15	COSUI 2	Rédiger un avenant à la convention de co-production	AFB/IGN	30/09/2017	
16	COSUI 2	Planifier et organiser le COPIL	AFB/IGN	30/09/2017	

1. Suivi des actions

Action 1 : Récupérer le réseau principal de l'AE Adour-Garonne

Une demande a été formulée lors des 2 précédents GIGE pour récupérer ce réseau principal.

Il s'avère que l'AE Seine-Normandie a, elle aussi, défini un réseau principal.

L'action est donc requalifiée en ajout la récupération du réseau principal de l'AE Seine-Normandie.

Action 2 : Présenter des scénarios d'utilisation de l'Espace collaboratif

Trois scénarios d'échanges ont été présentés à l'AFB et aux Agences de l'eau.

Nouvelle action (action 9) : configurer l'Espace collaboratif pour la mise en place des échanges.

Action 3 : Sensibiliser et former les acteurs de l'eau à l'utilisation de l'Espace collaboratif

Les géomaticiens de l'AFB et les AE ont eu une journée de présentation de la

| BD Topage® et de l'Espace collaboratif.

Action 4 : Définir les attributs à filtrer lors de la diffusion des données

| La présentation des spécifications de contenu aux AE a permis d'avancer sur ce point (pour les tronçons).

| Cette définition passe aussi par la validation du dictionnaire de données et la rédaction du scénario d'échange de la BD Topage®.

Action 5 : Documenter les données diffusées

| Une première version a été rédigée pour les tronçons. Elle a été présentée aux AE.

Action 6 : définir les règles de mises à jour des données BD Topage®

| Des consignes ont été données aux collecteurs pour :

- Ne pas modifier l'hydrographie (verrouillage dans Géoconcept) en cours de production de la BD Topage®,
- N'intégrer le résultat de la restitution.

| Des contrôles seraient à ajouter dans les outils des collecteurs Majec pour s'assurer que les règles de mise à jour sont bien appliquées.

Action 7 : Définir le périmètre de la réunion nationale de lancement de la BD Topage®

| L'action reste à mener.

Action 8 : Mettre en place le site d'information sur la BD Topage®

| Le site bdtopage.eau.fr a été créé.

| Le contenu éditorial sur ce site est à ajouter (le contenu existe déjà en grande partie)

Action 9 : Configurer l'Espace collaboratif

| Une réunion de travail est prévue le 20 juillet.

2. Contexte

Dans le cadre de la convention de coproduction ONEMA – IGN relative à la coproduction de la BD TOPAGE®, deux instances de suivi ont été prévues : le comité de pilotage et le comité de suivi. La composition et les missions du comité de suivi ont été définies pages 6 et 7 de la convention. Le comité de suivi doit se réunir au moins tous les trimestres ou plus si nécessaire.

Ce compte rendu est celui du COSUI n°2.


3. Avancement de la co-production

Production

La mise à niveau hydrographique est terminée à 97%.

24% des secteurs ont été traités en phase 1 – appariement des tronçons de cours d'eau (voir carte d'avancement).

Les surfaces d'eau seront traitées en centralisé pendant l'été.

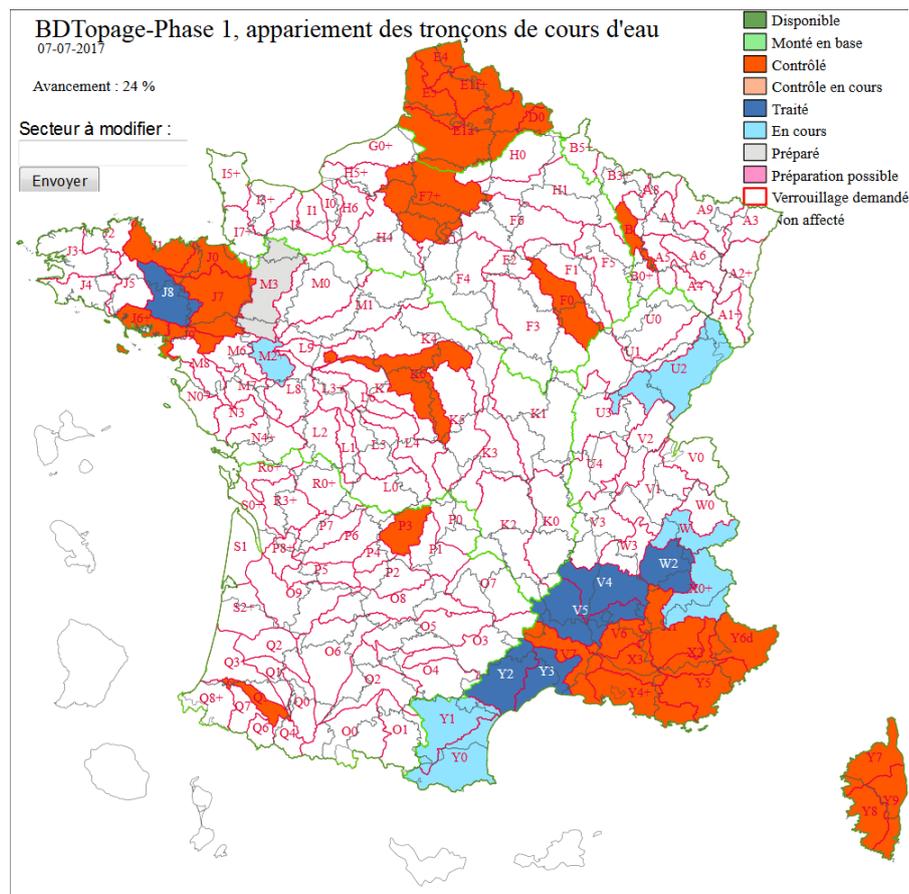

Recette et diffusion

La documentation est en cours de rédaction : elle est en cours de relecture pour les tronçons.

Un travail reste à réaliser pour définir les attributs à diffuser. Il faut, entre autre, finaliser le dictionnaire de données et les scénarios d'échanges.

4. Gestion collaborative de la BD Topage®

Paramétrage de l'Espace collaboratif

3 scénarios d'échange ont été présentés à l'AFB et aux membres du GIGE.

Une réunion de travail est prévue pour affiner ces scénarios et permettre le paramétrage du groupe BD Topage de l'Espace collaboratif.

Point d'attention : il faut que ce groupe soit fonctionnel lors des présentations du Topage Tour.

Gestion des alertes

Il est proposé de différencier (au moins dans le vocabulaire) les **alertes automatiques** provenant d'un conflit attributaire au moment de l'appariement entre la BD Carthage® et la BD Uni GE et les **questions** posées par opérateurs au cours du processus de production.

Les premières ne sont pas bloquantes à la diffusion de la BD Topage® alors que les secondes sont plus bloquantes et devront donc être traitées de manière prioritaire.

Pour information sur la volumétrie des alertes, sur la Corse (ie 3 petits secteurs) : 1200 alertes automatiques ont été générées. D'expérience après une vingtaine de secteurs : il faut compter environ 5 questions par secteur.

Concernant la réponse aux alertes, il conviendra d'assurer une **animation de réseau** pour que leur traitement ne reste pas en souffrance. L'AFB dispose d'un réseau régional et départemental qui devrait permettre d'assurer cette animation (action 10)

5. Action de communication

Topage Tour

Le Topage Tour doit être corrélé avec la production de la BD Topage®. Il peut donc être envisagé, idéalement avant la fin de l'année sur 3 régions dont la couverture de la BD Topage® sur le territoire est suffisamment conséquente (voire totale) :

- Bretagne,
- PACA,
- Haut-de-France

Compte tenu des délais de préparation de ces journées, il convient de prendre contact dès à présent (action 11) avec les relais locaux concernant l'organisation de ces journées.

Ces journées devraient prendre le format suivant :

- Matinée : présentations
- Après-midi : ateliers (inscription sur l'Espace co, saisie d'alertes, contributions au guichet, ...).

Site internet

Le site bdtopage.eaufrance.fr est en cours de réalisation.

Le contenu éditorial existe déjà en grande partie.

Les CR des COSUI peuvent être ajoutés sur ce site.

6. Programmation

Il faut, d'ici la fin de l'été, définir un programme de coproduction de la BD Topage® initiale phase 1 pour l'année 2018.

- AP est terminé.
- LB et RMC sont en cours.
- Les AE de SN et de RM risquent d'avoir moins de disponibilité dans les mois à venir.
- Il semble donc tout à fait pertinent **qu'AG soit le prochain bassin versant traité en BD Topage®.**

Un programme plus précis sera néanmoins à rédiger avant la fin de l'été (action 12). Ce programme tiendra idéalement compte de l'intégration des inventaires.

7. Intégration des inventaires

Une stagiaire de l'Onema travaille sur un audit des différents inventaires existants (pré-inventaires, cartographies police de l'eau) et doit présenter ses premières conclusions avant la fin du mois de juillet. Ces conclusions serviront à voir plus clair sur les inventaires qui doivent être intégrés à la BD Topage®. (Action 13 : étudier ces conclusions pour choisir les inventaires à intégrer. Action 14 : faire des tests d'intégration de ces inventaires et chiffrer ces intégrations. Action 15 : rédiger un avenant à la convention de co-production).

L'intégration des inventaires se fera par l'ajout d'un attribut sur les objets pour savoir si, oui ou non, ils appartiennent à l'inventaire.

8. COPIL

Un COPIL portant sur le renouvellement de l'accord cadre IGN-« Onema » et son extension aux nouvelles problématiques Biodiversité est en cours de préparation. Pour ne pas multiplier les COPIL, il faut regrouper ces 2 COPIL en un seul (tout en marquant la transition d'un COPIL à l'autre). Compte tenu de travaux prévus à l'AFB, ce COPIL se déroulera à l'IGN.

Un COSUI de préparation du COPIL est à organiser avant ce COPIL. (Action 16 : planifier et organiser le COPIL).
